

致：大银集团（DAYIN）管理层

三个网站， 两门生意， 一个团队。

大银集团数字营销升级方案——附三个已按可上线标准做好的网站样例。请先扫码看样例，再看方案。

22 页

已完成的样例页面（三个站点）

12 周

确认后到全部上线

0 元

样例阶段贵司无需支付 [BBK 确认]



手机扫码打开样例总览
<https://aailee779-coder.github.io/>

三分钟看懂这份方案

我们看到的

贵司的根基很扎实，网站没有把它讲出来。

35 年注塑经验、100+ 台机器、越南新厂、自有品牌飞镖机——这些在网站上要么被埋在“关于我们”，要么用一个 Wix 模板呈现。现有四个站点的 Google 移动端性能得分为 42–72 分（满分 100），.cn 首页体积 9.9 MB。数据见第 4 页。

我们做了什么

先把样例做出来，再谈合作。

三个网站按可上线标准重建：DARTMAN Games（8 页，含 3D 机台配置器）、大银制造双语站（9 页，含越南专页与六步询价）、DAYIN Sport 商城（5 页，完整购物流程）。全部数字均来自贵司公开资料；未验证的数字标注为“待确认”。

数据说明

新版比现状更快、更轻、更规范。

移动端性能：DARTMAN 72→78，大银制造 53→79（英文）/ 42→82（中文），商城方向 59→77。页面体积从 2.7–9.9 MB 降到 1.0–1.2 MB；SEO 与最佳实践两项全部 100 分。方法与逐项数据见第 4–5 页。

我们建议的下一步

12 周分三阶段上线，按里程碑付款。

第 4 周 DARTMAN 上线 → 第 7 周大银制造 .com/.cn 上线 → 第 9 周商城上线 → 第 12 周社媒与数据看板运行。域名、账户、源码全部归大银所有。费用与付款节点见第 11 页。

贵司只需回复一句话：“确认第一阶段（DARTMAN）”，我们下周一启动。若需先到厂当面沟通，BBK 在东莞，随时可到长安。

需要贵司确认的三个问题

1. madeindayin.com（海外站）目前是否也在投放百度 SEO/SEM？需求书中写了，但海外买家不用百度。

2. 越南工厂机台数：官网首页写 40 台，越南页写 24 台，需求书写 25 台。以哪个为准？

3. 三个飞镖站点（madeindayin.com/sporting、dayinsport.com、dartmangames.com）今后如何分工？我们建议：代工归 madeindayin，品牌归 DARTMAN，零售归 DAYIN Sport。

本方案的三个原则

• 不编造。没有虚构的案例、评价或数据；样例中的示例商品与价格均已标注。

• 不碰贵司现有资产。样例部署在 BBK 自己的地址，未触碰贵司域名、DNS、后台与广告账户。

• 不绑定。账户以大银名义开设，源码交付，合作终止 5 个工作日内移交全部权限。

需求书按渠道写，我们按生意答。

贵司的需求书列了四个网站（madeindayin.cn / .com、dartmangames.com、dayinsport.com、规划中的商用扫地机站）和六个渠道（抖音、视频号、LinkedIn、Instagram、Facebook、搜索引擎）。我们逐字复述过，也逐个看过。结论是：这是**两门不同的生意**，客户、周期、指标完全不同，应该分开做。

生意 A · 卖产能

madeindayin.com / .cn

客户：海外采购经理、品牌方。周期：3-12 个月。指标：合格询盘数、询盘质量、到厂拜访数。

渠道：Google 搜索、LinkedIn、行业展会；.cn 对应百度与国内客户。

关键资产：越南工厂。它应当是首页的主角，而不是“关于我们”里的一个子项。

生意 B · 卖自有品牌

dartmangames.com · dayinsport.com

客户：酒吧老板、经销商（DARTMAN）；家庭玩家（DAYIN Sport）。周期：几天到几周。指标：经销商申请、报价请求、订单。

渠道：Instagram、Facebook、YouTube、Google 购物；国内用抖音与视频号。

关键资产：EDmini 的三个数字——11 cm、65 kg、一人安装。

因此

一套品牌，三种语气。三个站统一使用大银橙与 DAYIN 字标（子品牌 DARTMAN / SPORT），版式各按其行业标杆搭建：大银制造像 Protolabs（报价优先），DARTMAN 像 Dartshopper（品牌电商），商城像 Darts Corner（零售列表）。三个站互相链接，各说各的话。

因此

先做快的那一边。DARTMAN 买家周期短，新站上线 2-4 周就能看到经销商询盘。代工询盘慢是行业规律，第一个合格询盘可能第 2-3 个月，我们现在就说清楚。

因此

扫地机站先不做。产品线与品牌尚未确定，建站等于猜。建议先在大银制造站放“清洁电器”栏目承接询盘，产品定型后再独立建站。

我们对标了谁



四个站点的体检报告

工具：Google Lighthouse（Chrome 内置，Google 用同一套指标评估网页体验），模拟移动网络。分数满分 100；Google 认为 90 以上为“好”。同一天、同一设置测量四个站点首页。

站点（首页）	性能·移动	性能·桌面	最大内容渲染 LCP	页面体积	请求数	布局偏移 CLS	无障碍	SEO
dartmangames.com	72	44	15.6 s（桌面）	4.2 MB	251	0.00	93	100
madeindayin.com	53	44	5.8 s（移动）	3.0–4.8 MB	47–58	0.00	76	92
madeindayin.cn	42	59	6.6 s（移动）	9.9 MB	86	0.797	60	83
dayinsport.com	59	55	8.6 s（桌面）	2.7 MB	38–42	0.00	96	100

LCP：用户看到主要内容所需时间，Google 标准 ≤ 2.5 s。CLS：页面加载时内容跳动程度，标准 ≤ 0.1；.cn 首页移动端 0.797 意味着用户点击时按钮会“跑掉”。页面体积中 .cn 有 9.6 MB 是图片，未压缩。

十二项发现（摘自诊断报告，证据截图见附件）


严重	F2 · dartmangames.com 唯一联系邮箱属于另一家公司名下（jinweiplastic.com）
严重	F6 · 没有任何面向买家决策的转化资产：无报价流程、无经销商申请、无规格下载
高	F1 · 英文站导航里有未翻译的繁体中文菜单项（商店 / 通知 / 我的訂閱）
高	F9 · 越南工厂是“关于我们”的一个子项，不是网站定位
高	F11 · dayinsport.com 已上线且为 B2B 代工站，与需求书描述不符；飞镖代工现在分散在三个站
高	F3 · 测试页面进入了生产环境（/facts-about-us-test-test、/copy-of-terms-of-service）
中	F10 · 越南机台数在三处不一致（40 / 24 / 25）
中	F7 · 需求书将 .com 海外站的工作列为百度 SEO/SEM
中	F5 · “高端产品线”只有一个产品
中	F12 · .cn 标题已含“越南注塑厂”，但内容与 .com 未联动
低	F4 · YouTube 图标链接到单个视频而非频道
低	F6b/6c · 建站平台为 Wix（限制性能与 SEO）；LINE 为海外站唯一即时联系渠道
优势	F8 · 英文内容体系已经存在且质量不错——差距不在内容量，在呈现与转化

一句话：内容有、根基有、产品有；缺的是速度、结构和让买家动手的入口。这些都可以在 12 周内解决。


样例已经比现状快了，上线后还会更快。

同样用 Lighthouse 测量样例站点（本地服务器，未经 CDN 加速）。正式上线后接入 CDN 与图片自动压缩，桌面端数字会继续提升。所有页面均通过 SEO 与最佳实践两项满分检查。

移动端性能得分（越高越好）

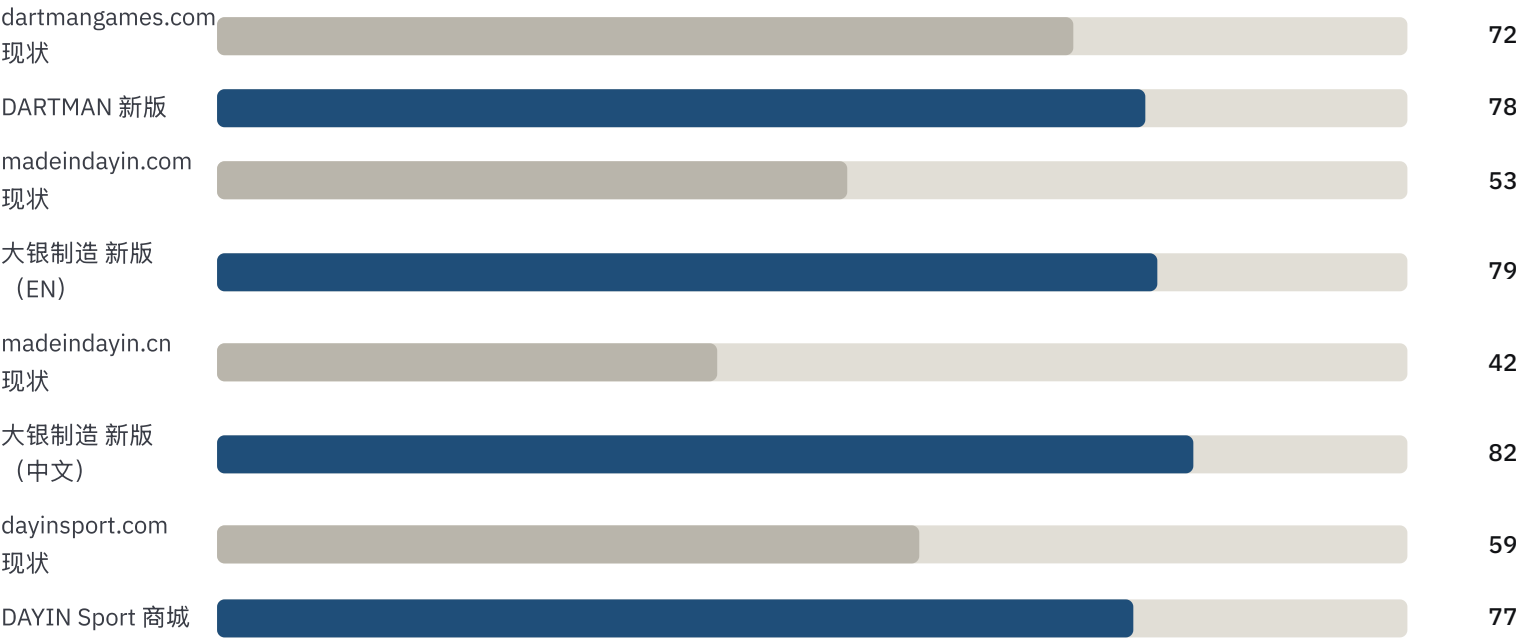

首页体积 MB（越低越好）

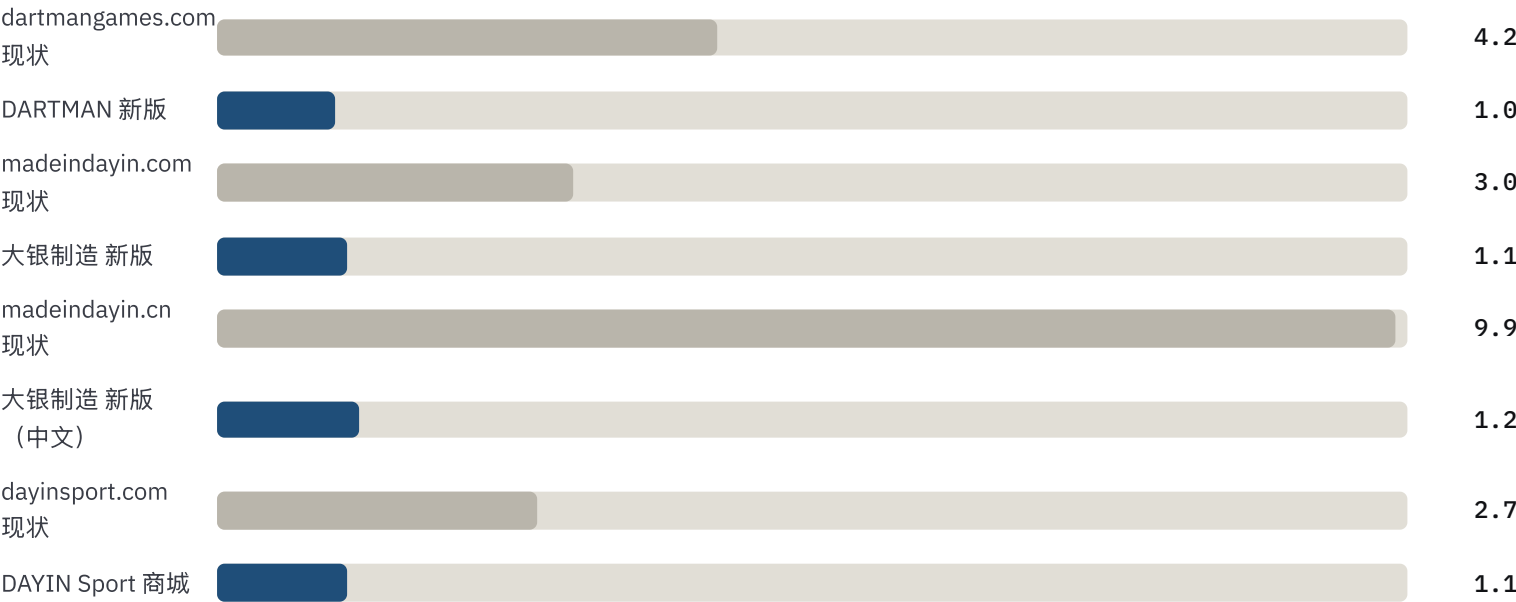


	现状（4 站）	新版（3 站）	说明
首次加载请求数	38 - 251	22 - 31	请求越少，弱网络下越稳定
主线程阻塞 TBT	2 - 628 ms	0 - 30 ms	页面加载时是否“卡住不能点”
布局偏移 CLS	0 - 0.797	0.00	新版所有图片预留尺寸，不跳动
最佳实践 / SEO	58-100 / 83-100	100 / 100	HTTPS、无控制台错误、元数据、结构化标题
无障碍	60 - 96	89 - 98	对比度、键盘导航、替代文本

DARTMAN Games：把三个数字卖出去。

EDmini 的卖点不是“电子飞镖机”，而是 **11 cm 机头**、**65 kg**、**一人免工具安装**——这三个数字决定酒吧老板要不要腾出一个角落。新站按 dartshopper.com 的结构搭建：信任条、搜索、分类导航、轮播主视觉、热门分类、场景入口、产品卡、视频、SEO 文案——酒吧老板一眼就知道这是一个“能下单”的品牌站。

已完成 · 8 页

首页	三帧轮播（EDmini / 经销商 / 联赛）、三个推广位、六个热门分类、八种场景、精选产品卡（五种配色 + 配件）、双横幅、13 款游戏、视频区、SEO 文案、信任跑马灯、客服条、订阅与五栏页脚
EDmini	3D 配置器 + 对应实拍图、十项特性、规格表（含 P/D 机型对比）、三箱装运尺寸、85/180 台装柜量
Games	13 款游戏、eDARTS App、SDBplay 2、运营工具（欢乐时光、广告轮播、投币设置）
For venues	回本计算器（价格由用户输入，不预设）、联赛飞轮、场地咨询表单
Dealers	三级经销商方案、三步申请流程
Find a venue	全球场地地图与联赛状态（示例数据，已标注）
About / Contact	大银 1989 → 2024 时间线、三地地址、咨询表单
Before / after	新旧首页对比滑块 + 实测数据表

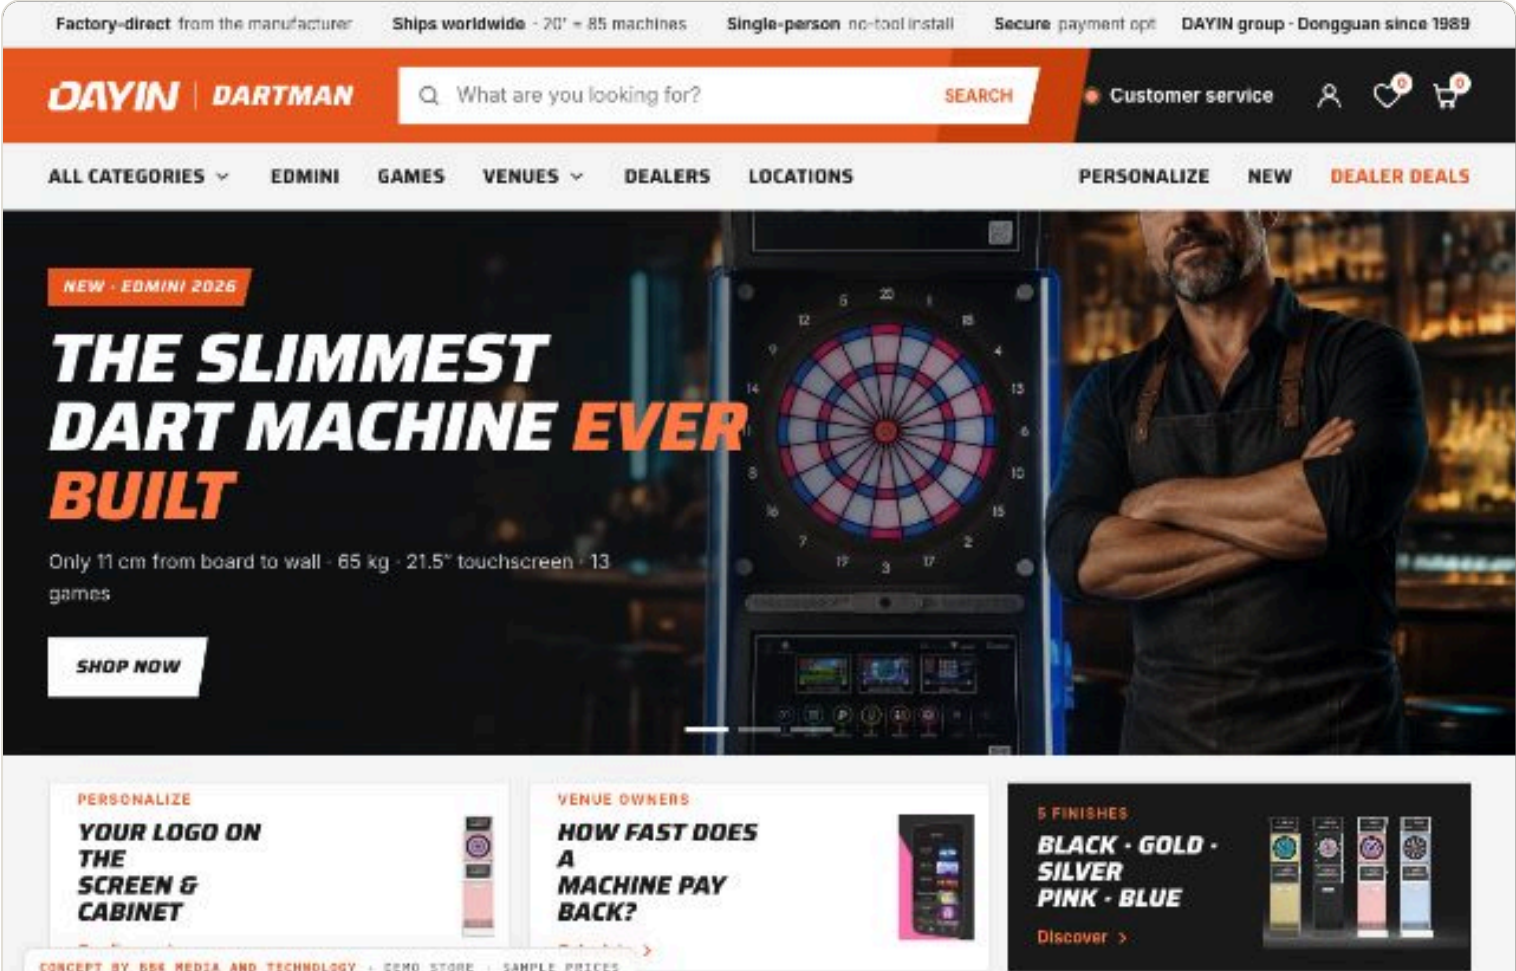


大银制造：越南是正门，不是脚注。

海外采购经理打开网站，三秒内要知道三件事：你能做什么、在哪里做、怎么开始。新站首页按 protolabs.com 的结构搭建：面包屑、大标题 + 即时报价、认证前置、三项关键数字、工艺卡片、配套能力、材料表、**东莞 + 北宁两基地对照**、行业、四步流程、资源与报价 CTA；“中国 + 越南”成为一级导航；越南专页保留 3D 地球仪；越南专页原文引用了贵司官网的五条买家问答，并加了一个“不适合去越南”推荐器——因为贵司自己也说：概念阶段的项目不适合越南线。

已完成 · 9 页（英文 8 页 + 中文首页）

首页	报价优先的 Protolabs 结构：四个工艺卡、六项配套能力、材料表、两基地卡、六大行业、四步流程、三篇资源、报价 CTA（中英两版）
China + Vietnam	三类买家压力、逐项对照表（未验证数字标注）、四问推荐器、官网 FAQ 原文
Capabilities	模具 / 注塑 / 二次加工 / 电子组装 / 品控实验室，材料与工艺标签
Products	扫地机器人、宠物喂食器、餐具、电子飞镖——用贵司现有产品图
Quality	ISO 9001（大银 + 嘉旭）、GRS、SMTA、SCAN、Target 验厂、越南海关核查
RFQ	六步询价：项目类型 → 阶段与年量 → 基地 → 材料工艺 → 图纸 → 联系与回顾；草稿自动保存
About / Contact	1989 → 2024 时间线、三地地址
中文首页 /zh/	同一结构的简体中文版，作为 .cn 改版的样例

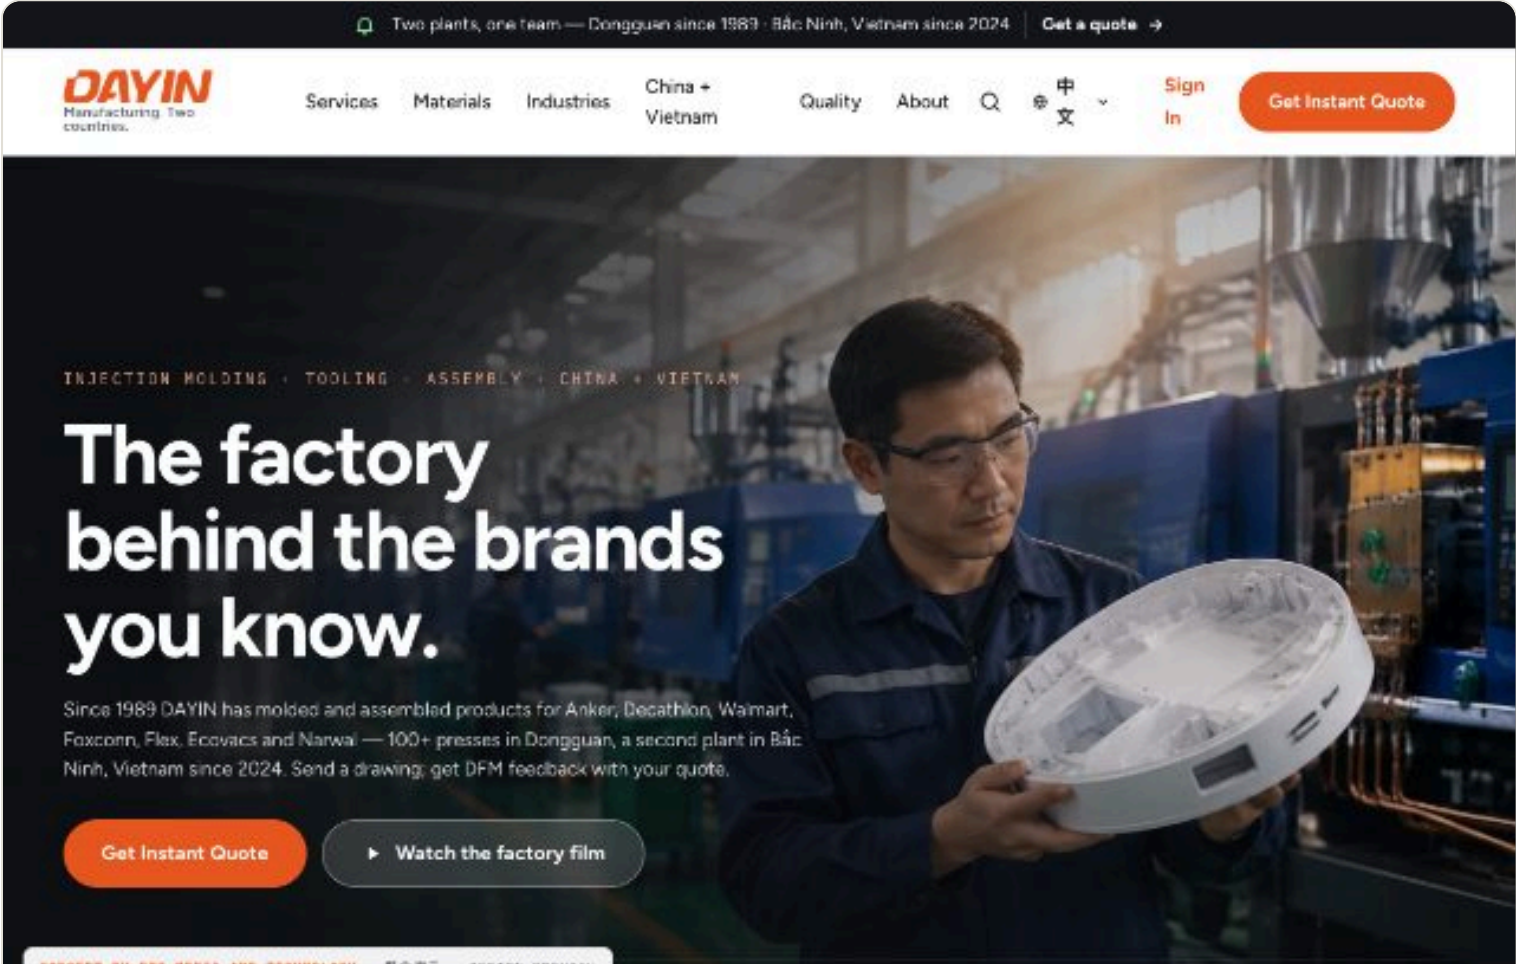

DAYIN Sport：把代工厂变成零售品牌。


dayinsport.com 目前是一个 B2B 代工站，与 madeindayin.com/sporting 功能重叠。我们建议把它转向**面向海外家庭玩家的零售商城**——“做了 1200 万块板的工厂，直接卖给你”是一个别的品牌讲不出来的故事。样例按 dartscorner.com 的结构搭建（黑色导航条、轮播、精选方块、场景入口、新品、系列墙、个性化定制、内容卡），列表页与其镖盘列表页一致：侧栏筛选、库存与 SKU、加入购物车、加载更多、SEO 文案。24 个 SKU、完整购物流程。

已完成 · 5 页 + 购物车抽屉 + 搜索

首页	三帧轮播、精选镖盘 / 系列 / 自动计分方块、八种使用场景、新品五卡、系列墙、工厂数据（来源 dayinsport.com）、九项个性化定制、三张内容卡、SEO 文案
Collection	dartscorner 式列表：产品 / 系列 / 功能 / 价格筛选（带数量）、五种排序、24 个 SKU、每页 12 个 + 加载更多、库存与 SKU、SEO 段落
Product	图片画廊、颜色与套装选择、数量、加入购物车、规格折叠、四款电子板对比表、搭配推荐
购物车	侧滑抽屉、数量增减、满 150 美元包邮进度条、配件推荐
Checkout	信息 → 配送 → 支付 → 完成，订单摘要，生成订单号（演示）
Support	物流 / 退换 / 保修 / App 设置 / 批发，客服表单

数据口径

商品品类来自 dayinsport.com 的六条产品线；商品名、价格、库存为示例数据，页面已标注“Demo”。**没有放任何虚构的用户评价**——评价模块留空，上线后接入真实评价。客厅、车库、儿童房等场景图由 AI 基于贵司真实产品图生成，产品外观未改动。

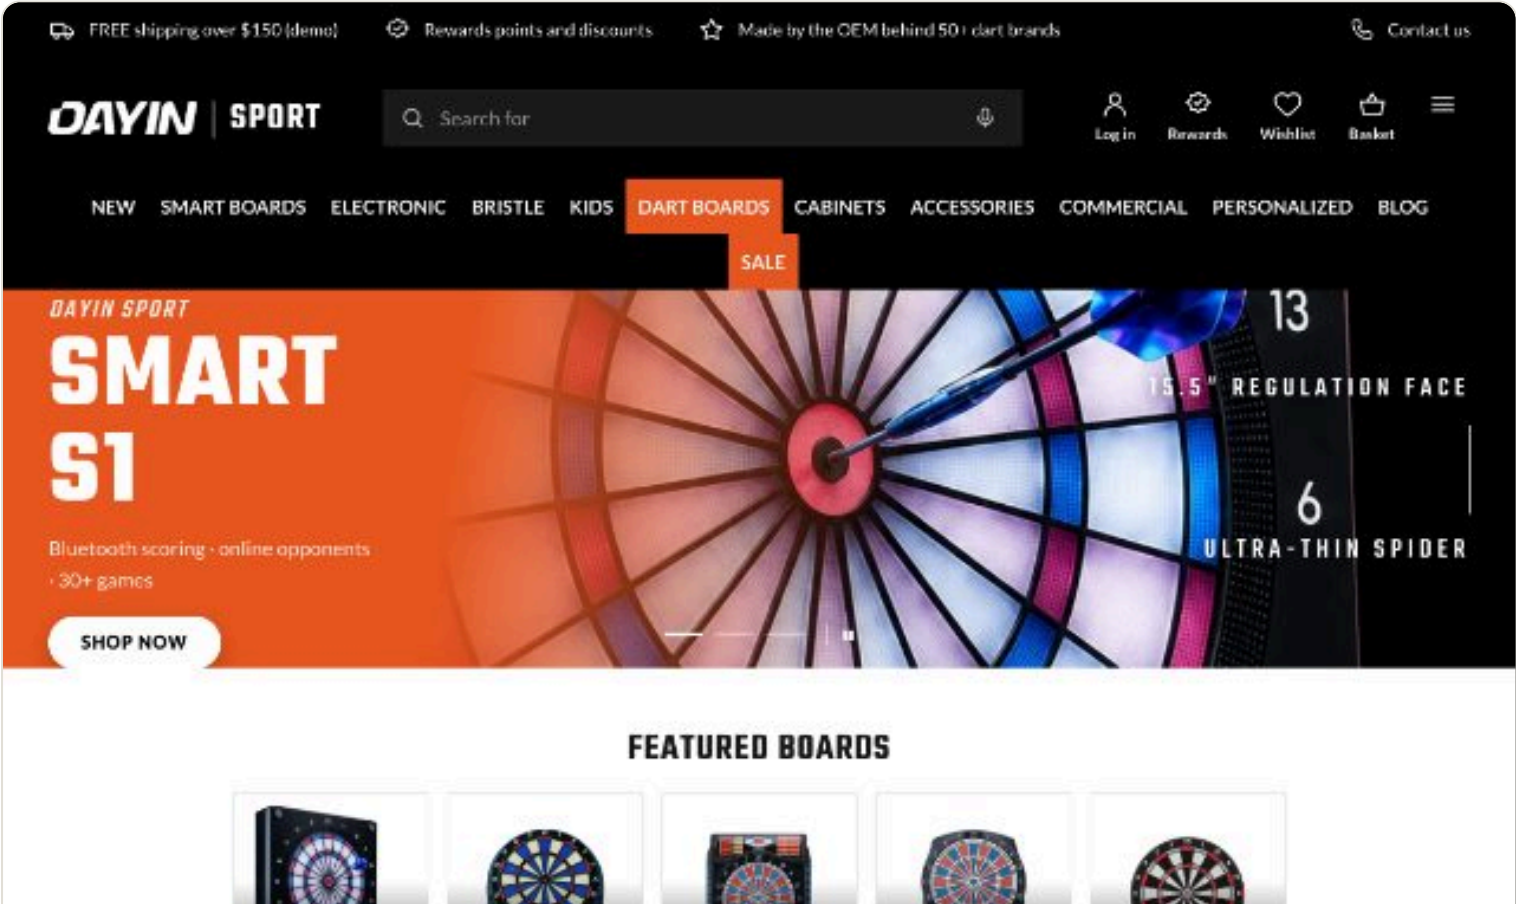

做了什么，还差什么，谁来做。

● 已完成（样例中可见） ● 上线前必须完成（BBK） ● 合作后完成 / 需贵司提供

站点	项目	状态	责任方
DARTMAN	dartshopper 结构首页、8 个页面、3D 配置器、滚动转台（72 帧）、回本计算器、经销商申请、场地地图、新旧对比、11 张 AI 场景图、统一大银橙 + DAYIN 字标	● 已完成	BBK
	表单后端（邮件 / 企业微信通知）、垃圾信息过滤	● 上线前	BBK
	从 Wix 迁出：域名 DNS 切换、旧链接 301 跳转、Search Console 提交	● 上线前	BBK + 贵司授权
	官方联系邮箱（@dartmangames.com）、YouTube 频道、LinkedIn 主页	● 待提供	贵司
	真实场地与经销商数据导入	● 合作后	贵司提供 · BBK 导入
	产品补拍（五种配色实物 + 酒吧场景视频）	● 合作后	BBK 到厂拍摄
大银制造	Protolabs 结构首页（中英）、8 个英文页面、地球仪、推荐器、六步询价、材料表、统一大银橙 + DAYIN 字标	● 已完成	BBK
	.cn 全站中文版（其余 7 页翻译与本地化）	● 上线前	BBK
	询价路由（工程师邮箱 / CRM）、NDA 模板下载	● 上线前	BBK
	.cn 备案信息核对、百度站长平台、Google Search Console	● 上线前	BBK + 贵司授权
	越南机台数确认、证书扫描件、官方邮箱	● 待提供	贵司
	两厂实拍（东莞 + 北宁）	● 合作后	BBK
DAYIN Sport	dartscorner 结构首页与列表页、24 个 SKU、筛选 / 搜索 / 加载更多、购物车、结账流程、统一大银橙 + DAYIN 字标	● 已完成	BBK
	支付接入（Stripe / PayPal）、税费与物流规则、订单邮件	● 上线前	BBK
	正式商品目录、价格、库存、保修条款	● 待提供	贵司
	海外仓 / 直邮方案、退换货流程	● 合作后	贵司决策 · BBK 配置
	真实用户评价接入（Judge.me 等）、邮件营销（Klaviyo）	● 合作后	BBK
社媒与内容	LinkedIn x3、Instagram x3、抖音脚本 x2、视频号脚本 x1、30 天内容日历（附件）	● 已完成	BBK
	账号开通与认证（抖音企业号、视频号、LinkedIn 主页、Meta 商务管理）	● 合作后	贵司名义 · BBK 操作
	首月 12 条内容拍摄与发布、投放账户搭建	● 合作后	BBK

确认后 12 周，三个站全部上线。

以 9 月 28 日（周一）启动计算；第 1 周含国庆假期，已留出余量。每周五发一页纸进度报告；每个里程碑由贵司验收后进入下一阶段。

周	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
启动 · 素材与数据确认												
到厂拍摄（东莞）												
阶段一 · DARTMAN 上线				★ 上线								
阶段二 · 大银制造 .com + .cn							★ 上线					
阶段三 · DAYIN Sport 商城									★ 上线			
社媒账号 · 首月内容												
投放（Google / Meta / 抖音）												
数据看板 · 周报												★ 验收

第 1-2 周

确认与收集

三个问题的答案、邮箱与账号、证书、产品目录；到厂拍摄。

第 4 周 · 10 月 25 日

DARTMAN 上线

迁出 Wix，域名切换，表单通知，Search Console。

第 7 周 · 11 月 15 日

大银制造上线

.com 英文 + .cn 中文，询价路由，百度与 Google 收录。

第 9 周 · 11 月 29 日

商城上线

支付、物流、税费；黑五与圣诞季前完成。

可以更快吗？ 可以：如果只做阶段一，DARTMAN 在第 4 周上线后即可停下来看数据，再决定阶段二、三。这也是我们推荐的做法——先看快的那一边动起来。

固定费用，按里程碑付款，验收后才算完成。

阶段	交付物	费用（人民币）	付款节点
阶段一 DARTMAN Games	8 页英文站、3D 配置器、回本计算器、经销商申请、场地地图、 表单后端、Wix 迁出与 301、产品补拍 1 天、规格单 PDF	[BBK 填写]	30% 启动 40% 上线 30% 验收
阶段二 大银制造 .com + .cn	8 页英文 + 8 页中文、地球仪、推荐器、六步询价与路由、两厂 拍摄、备案核对、百度 / Google 收录、证书下载包	[BBK 填写]	30 / 40 / 30
阶段三 DAYIN Sport 商城	5 页商城、支付与物流接入、商品导入（≤ 40 SKU）、订单邮 件、评价与邮件营销接入、上线检查	[BBK 填写]	30 / 40 / 30
月度运营 （可选，按月）	社媒内容 12 条/月（拍摄 + 制作 + 发布）、投放管理、周报与月 报、看板维护、网站小改	[BBK 填写] / 月	月初预付
广告投放预算	Google / Meta / 抖音投放费用，由贵司账户直付平台，BBK 不经 手、不加价	[BBK 建议区 间]	贵司直付

归属

域名、主机、GA4、广告账户、社媒账号全部以大银名义开设，BBK 仅为管理员。源码在签约当天放入贵司仓库。

验收标准

每阶段上线前提供：Lighthouse 移动端 ≥ 80、三种设备实测截图、表单收信测试、旧链接跳转清单。贵司签字验收后付尾款。

退出条款

任一阶段验收后可停止，不影响已上线站点使用。合作终止 5 个工作日内移交全部权限与文件。

关于效果的实话

DARTMAN 新站上线后 2-4 周可见经销商询盘与计算器留资。代工（大银制造）的第一个合格询盘可能在第 2-3 个月，第一个成交通常在 6 个月以后——这是采购周期决定的，不是营销能缩短的。我们承诺的是每周可见的三个指标、每月一页纸报告，以及由数字决定要不要继续。保证数字的机构，请谨慎。

两种声音，绝不混用。

声音 A · 大银制造

工程师对工程师

LinkedIn 为主：越南工厂进度、模具与材料知识、验厂与认证、两厂对照。语气克制、数据说话、不喊口号。国内用视频号：厂区实拍、工艺短片，面向国内品牌方与同行。

• LinkedIn：每周 2 条（已备 3 条样稿）

• 视频号：每周 1 条（已备 1 条脚本）

• 搜索：Google (.com) + 百度 (.cn)

声音 B · DARTMAN / DAYIN SPORT

玩家对玩家

Instagram / Facebook / YouTube：机台在酒吧里的样子、联赛之夜、开箱与安装、五种配色。抖音：国内酒吧与飞镖馆场景、一人安装挑战。语气热、短、有画面。

• Instagram：每周 3 条（已备 3 条样稿）

• 抖音：每周 2 条（已备 2 条脚本）

• 投放：Google 购物 + Meta（海外）；抖音（国内）

首月内容日历（10 月 5 日 - 11 月 3 日）

周	大银制造 · LINKEDIN / 视频号	DARTMAN · INSTAGRAM / 抖音	投放
W1	越南工厂：为什么是北宁（数据帖）· 厂区实拍 60 秒	EDmini 三个数字（图文）· 一人安装挑战（短视频）	账户搭建、像素与转化事件
W2	模具 DFM 评审：开钢前的六个问题· 注塑车间短片	五种配色投票· 酒吧联赛之夜（Reel）	DARTMAN 经销商招募（LinkedIn + Meta）
W3	认证解读：GRS 与 Target 验厂· 两厂对照图	回本计算器演示· 开箱三箱装	Google 搜索：electronic dart machine / dart machine for bars
W4	“到岸总成本”一图看懂· 越南出货 CO 流程	13 款游戏 30 秒· 玩家 App 排行榜	复盘：CPL、询盘质量、下月预算



样稿与 30 天日历（附件）

<https://aailee779-coder.github.io/social/>

规则：不买粉、不刷量；抖音与视频号以贵司企业认证账号发布；所有素材版权归大银。

贵司问的五件事，我们怎么做。

一 · 线上定位

被找到、被记住、被信任

三个站各占一个搜索场景（越南注塑 / 电子飞镖机 / 蓝牙飞镖靶 / .cn 注塑加工）。一句话定位：“您熟悉的品牌，背后的工厂。”首页第一屏用 Anker、迪卡侬、沃尔玛、富士康等真实客户 Logo、证书、视频与相册说话；每站 2-4 个转化入口，表单 1 个工作日内回复。

二 · SEO

先修好，再写好，再链好

修（第 1-4 周）：移动端 ≥ 80 分、图片压缩与 CDN、清晰 URL / 标题 / H1、EN-中文 hreflang、站点地图与 Search Console / 百度站长、删除测试页与繁体菜单。**写（第 3-12 周）**：每站一组关键词（injection molding Vietnam · robot vacuum OEM · electronic dart machine · bluetooth dartboard · 越南注塑厂），每站每月 2 篇指南。**链**：展会与行业目录反向链接、LinkedIn 与 Google 商家互链。月报：收录、排名、自然流量、询盘。实话：第 4-6 个月才看自然询盘。

三 · 社媒管理

六个渠道，一张日历，贵司名义，BBK 操作

LinkedIn 每周 2 条（工厂进度、模具知识、验厂）· YouTube 每月 2 部（已有 11 部素材）· Instagram / Facebook 每周 3 条 + Reels（机台在酒吧里、联赛之夜）· 抖音每周 2 条 · 视频号每周 1 条。月初出 30 天日历 → 贵司确认 → BBK 拍摄制作 → 发布前贵司审一次。不买粉、不刷量；账号以贵司企业认证注册；素材版权归大银。

四 · 广告投放

贵司直付平台，BBK 搭建、优化、汇报

Google：搜索（大银制造 5 组词、DARTMAN 3 组）+ 购物（商城上线后）；**Meta**：DARTMAN 经销商招募（酒吧经营者受众）+ 商城再营销；**抖音 / 百度**：国内酒吧与飞镖馆、.cn “越南注塑厂”搜索词。先小预算测 4 周，按每次询盘成本加减。每周优化一次，每月复盘 CPL 与询盘质量。预算区间 **[BBK 建议区间]**，BBK 不经手、不加价。

五 · 数据与目标

每周三个数字，每月一页纸

GA4 + Search Console（海外）、百度统计 + 百度站长（.cn）、表单后台与询价路由，看板对贵司开放。生意 A 看合格询盘数与来源、到厂拜访；生意 B 看经销商申请、报价请求、商城转化。目标：DARTMAN 上线 4 周内首批经销商询盘；第 3 个月起每月 ≥ 3 条合格代工询盘 **[BBK 确认]**。由数字决定要不要继续。

我们不给您看 Logo 墙，给您看为大银做的东西。

同城

长安到 BBK 不到一小时

拍厂、开会、改稿当天来回。上海深圳的机构做不到，海外机构听不懂“开模”和“验厂”。

双语双市场

写给德州酒吧老板，也写给采购经理

英文面向海外买家的写法，和中文面向国内客户的写法，是两种能力。三个样例站已经证明了这一点。

先做再谈

付款之前，东西已经在这里

22 个页面、三套设计系统、一份体检报告、社媒样稿——都在您决定之前完成。这是最诚实的案例。

合作方式

沟通	一个项目经理对接；微信群 + 每周五进度页；重要节点到厂当面汇报
审批	每个页面上线前贵司确认一次；文案、图片、数据三项分别签字
数据	GA4 + 百度统计 + 表单后台，看板对贵司开放；每月一页纸报告
安全	不使用贵司现有账号密码；所有新账号以贵司邮箱注册；权限最小化
保密	签署 NDA；样例与本方案不对外展示

BBK 团队（本项目）

项目负责人	[BBK 填写姓名] · 策略与客户沟通
设计与前端	[BBK 填写] · 三个站点的设计系统与开发
内容与社媒	[BBK 填写] · 双语文案、拍摄、日历执行
投放与数据	[BBK 填写] · Google / Meta / 抖音投放，看板

如果贵司有可公开的合作案例要求：BBK 可在当面沟通时补充；本方案不列未经授权的客户名称。

下一步

今天

扫码看样例

三个网站在手机上各看三分钟。哪里不对，直接告诉我们。

本周

回复三个问题 + 一句话

百度、机台数、三站分工；然后“确认第一阶段”。

下周一

启动

签署 NDA 与阶段一合同，到厂拍摄排期，第 4 周 DARTMAN 上线。

启动前请贵司准备

- ☐ 三个问题的答复
- ☐ DARTMAN 与大银制造的官方联系邮箱
- ☐ dartmangames.com 域名管理权限（Wix 迁出用）
- ☐ ISO / GRS / SMTA / SCAN / Target 证书扫描件
- ☐ 产品目录与价格（商城阶段）
- ☐ 拍摄日期（东莞长安厂区，半天）

附录 · 数据来源

厂区 / 机台 / 人员 / 认证	madeindayin.com (/index、/about-da-yin、/vietnam-manufacturing) ， 2026-09-19 抓取
EDmini 规格 / 装柜	dartmangames.com (/edmini、/edarts-games) ， 2026-09-19
dayinsport.com 定位与数据	dayinsport.com 首页， 2026-09-19
性能数据	Google Lighthouse 12，模拟移动网络，现状 2026-09-19，新版 2026-09-20
越南 FAQ 五问	madeindayin.com/vietnam-manufacturing，原文引用
未验证 / 未使用	定价、经销商数量、装机量、营收、场地数量、App 用户数——均未在样例中作为事实出现



样例总览









<https://aailee779-coder.github.io/>

联系 BBK


[BBK 填写姓名] · [电话] · [微信] · [邮箱]

BBK Media and Technology · 东莞


附录 A · DARTMAN Games 全部页面

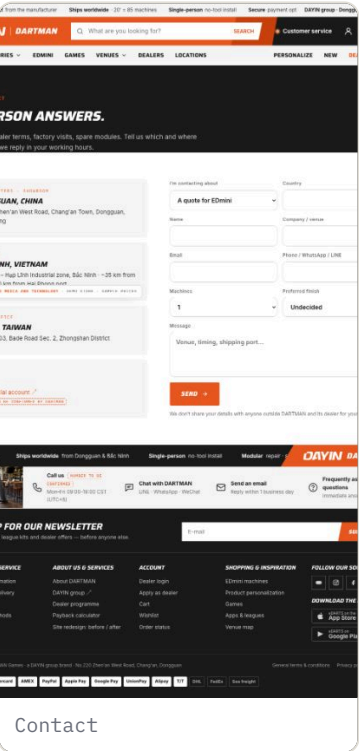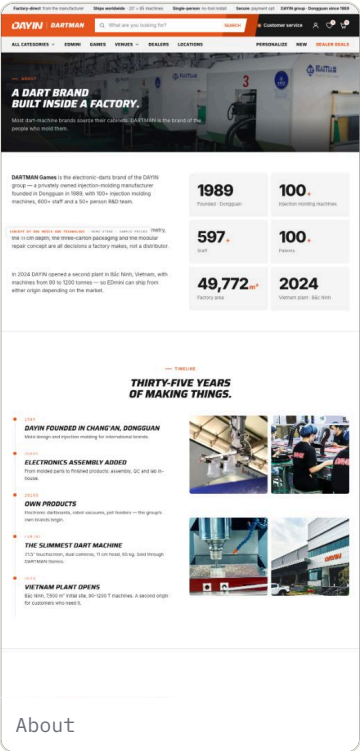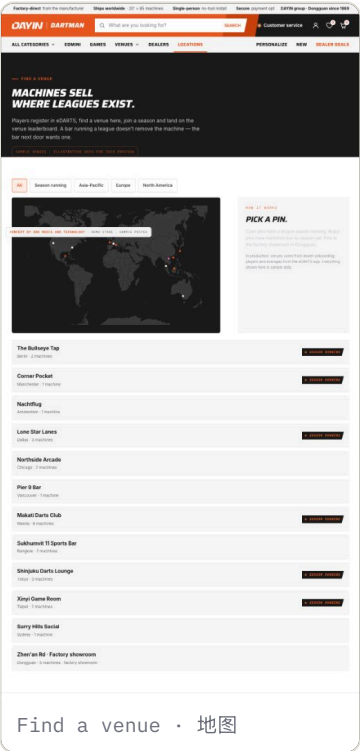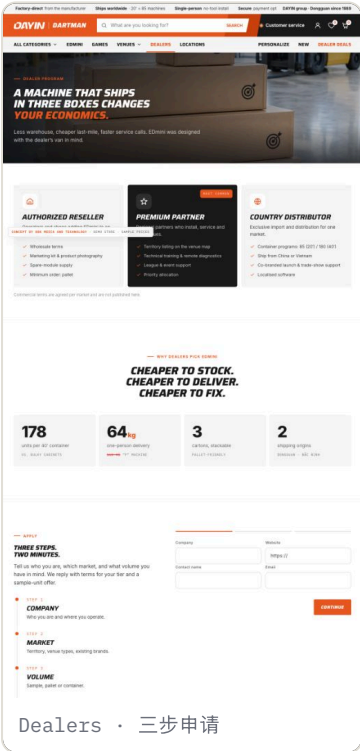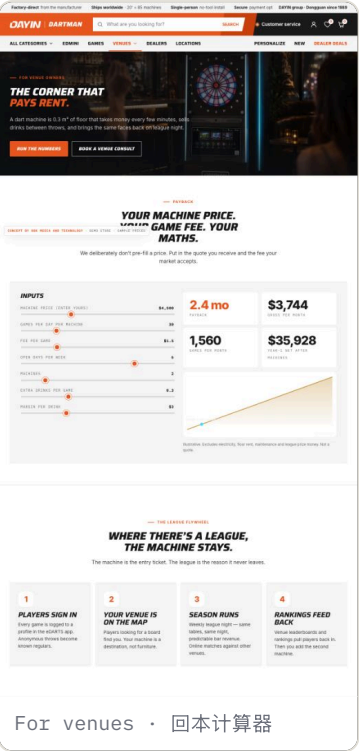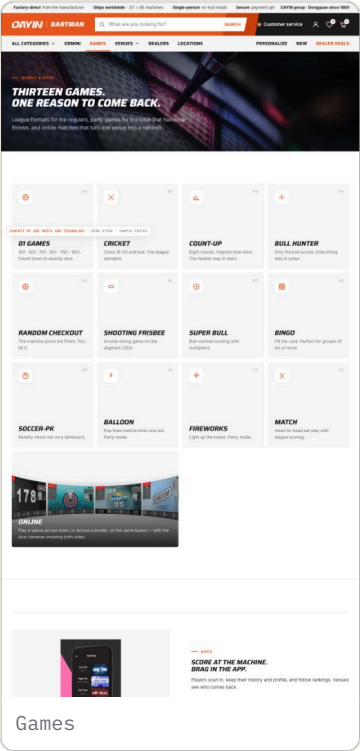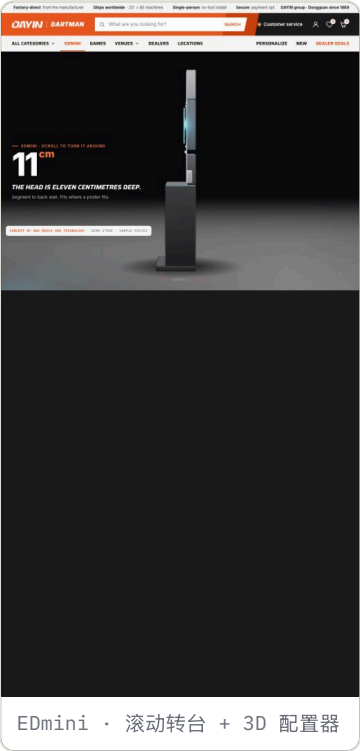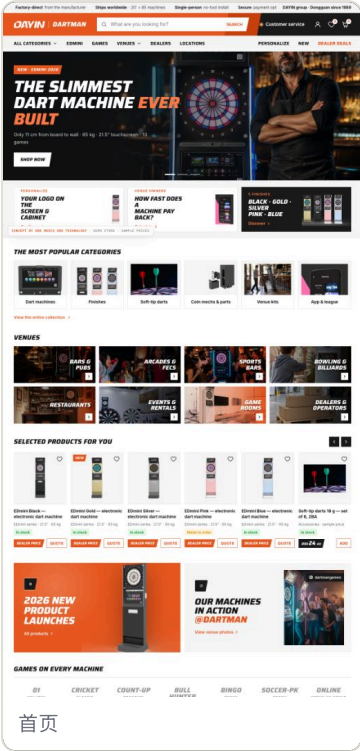


附录 C · DAYIN Sport 商城全部页面

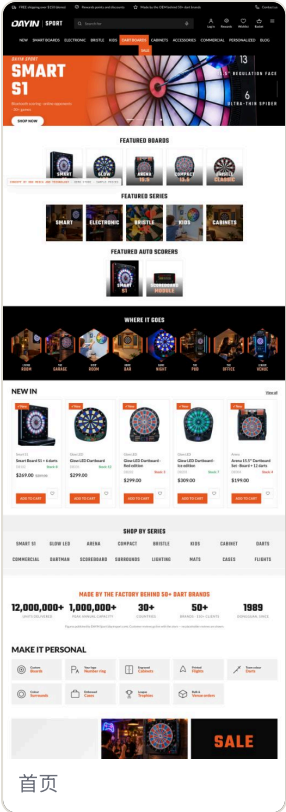


首页

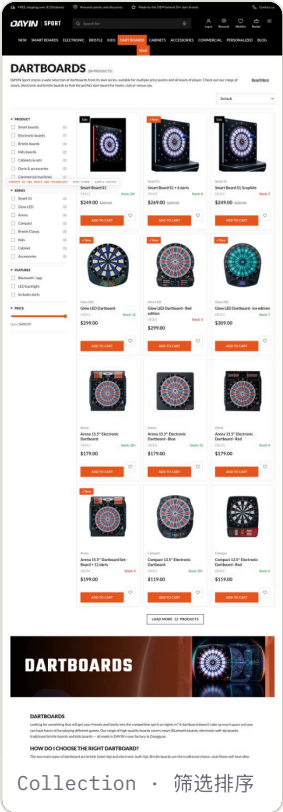


Collection · 筛选排序

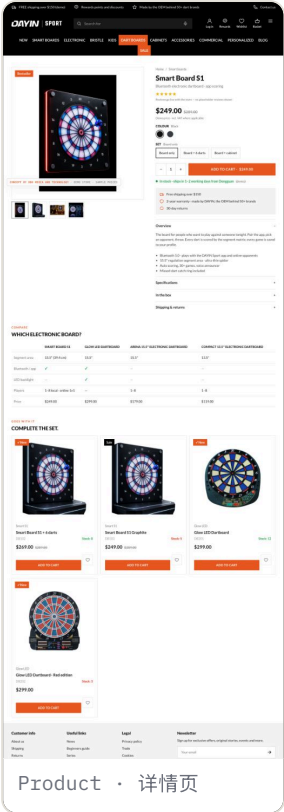

Product · 详情页

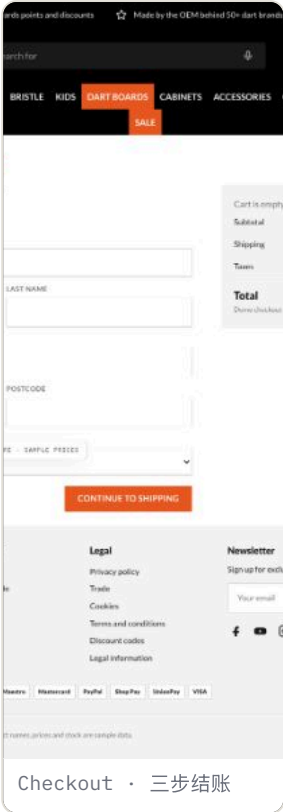

Checkout · 三步结账

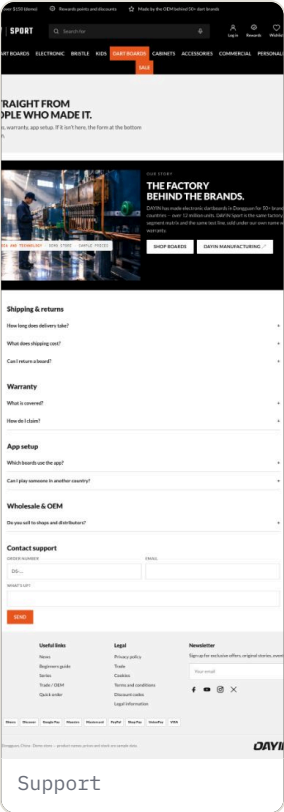

Support

购物车抽屉、搜索面板为页面内组件，未单独截图；扫码可直接操作。

附录 D · 24 张 AI 场景图

用贵司现有产品照片作为参考图生成（GPT Image 2.5），机台、镖盘、柜体外观保持不变；用于样例展示，上线前可用实拍替换或保留。



dm-hero-people



dm-bar-wide



dm-studio-hero



dm-league



dm-install



dm-cartons



dm-head-macro



dm-finish-black



dm-finish-gold



dm-finish-silver



dm-finish-pink



dm-finish-blue



dy-hero-people



dy-press-hero



dy-mold-macro




dy-pellets



dy-port



sh-hero-people



sh-hero-product



sh-living-room



sh-garage



sh-cabinet







sh-kids



sh-glow

附录 E · 社媒样稿

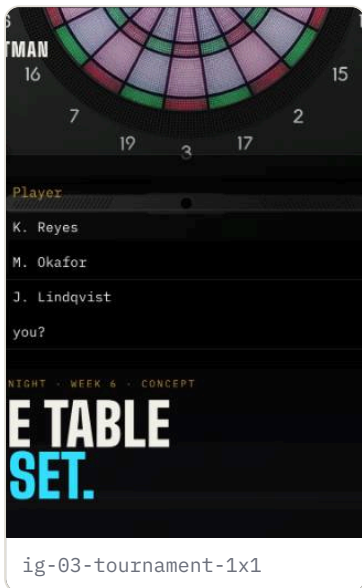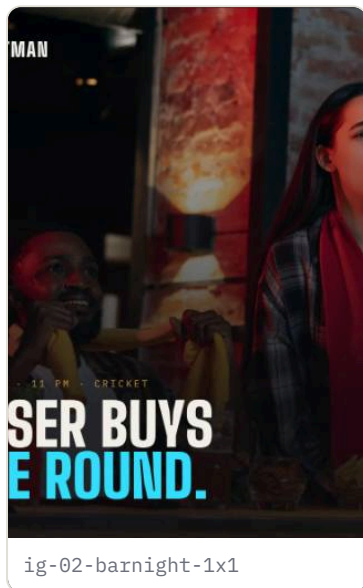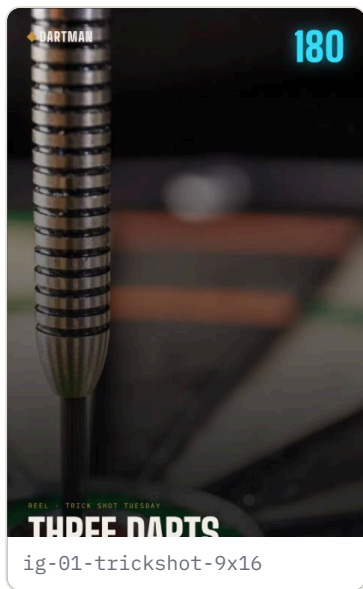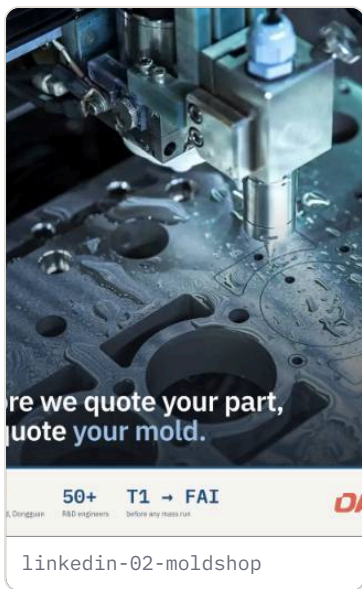

抖音与视频号完整分镜脚本、30 天内容日历见在线附件：<https://aailee779-coder.github.io/social/>

附录 F · 二维码总表

 样例总览	 方案书	 DARTMAN 首页	 EDmini · 3D + 转台
 回本计算器	 新旧对比	 大银制造首页	 越南专页
 六步询价	 中文首页	 商城首页	 商品页

所有链接均指向 BBK 自有地址；未触碰贵司任何域名。
